

KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI : Antalya-Kemer-Tekirova Yolu

PROJE BEDELİ : 294.452.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2003-2020

PROJE ÖZELLİKLERİ : Toplam uzunluğu 100 km , proje uzunluğu 99 km'dir. 51 Km'si BSK, 19 Km SK olmak üzere 70 km'si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında Kemer-Kumluca arasında 2 km BY/BSK ve Antalya-Tekirova arasında 10 km BY/SKÜBSK yapılması, Phasillis Tünelinde çalışılması ve binder seviyesinde tamamlanmış olan 21 km'de aşınma yapılması hedeflenmektedir. Yıl içinde 7 km BSK tamamlanmış, Phasillis Tünelinde çalışılmıştır. Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 1 km kısalma olacaktır.





PROJE ADI : Antalya-Alanya-Gazipaşa-5.Bl.Hd.(Antalya-Mersin Yolu)

PROJE BEDELİ : 590.802.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 1993-2020

PROJE ÖZELLİKLERİ : Yol ağıımızdaki uzunluğu toplam 192 km , proje uzunluğu 185 km olan yolun 174 km'si BSK'lı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Gökçebelen Tüneli ile birlikte Gazipaşa-5.Bl.Hd. Yolunun ihalesi 13.07.2016 tarihinde yapılarak 09.01.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.2017 yılında binder seviyesinde tamamlanan kesimlerde aşınma yapılması ve Gökçebelen Tünelinde çalışılması hedeflenmektedir. Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 7 km kısalma olacaktır.



KURUMU : KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI : Alanya Doğu Çevre Yolu

PROJE BEDELİ : 281.778.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2016-2019

PROJE ÖZELLİKLERİ : Alanya Doğu Çevre Yolu Alanya-Gazipaşa yolunun Alanya Geçişi Hasbahçe-Kargıcak arasında toplam uzunluğu 18 km' dir. Toplam uzunlukları 2x2552 m (5.104 m) olan 3 adet çift tüp (Dim, Oba, Mahmutlar Tünelleri) ile birlikte 15 km BY/BSK olarak projelendirilmiştir. 2017 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve Dim tüneline çalışılması hedeflenmektedir. Tünel ve köprü çalışmaları devam etmektedir. Dim Çayı geçişinde özel teknik viyadük projelendirilmiştir. Çalışmaların 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.



PROJE ADI : Alanya Ayr.-Hadim Yolu

PROJE BEDELİ : 380.240.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 1997-2020

PROJE ÖZELLİKLERİ : Proje uzunluğu 63 km, 9 adet tek t p t nel(5.981 m) tamamlanmıřtır.2017 yılında 1880 m uzunluęunda 2 adet tek t p t nel tamamlanması hedeflenmektedir. Mahmutlar imar sınırından itibaren 24 km' lik kesimde toplam uzunlukları 8,860 m olan 6 adet tek t p t nel ve 855 m uzunluęunda 5 adet viyad k ile birlikte proje alıřmaları devam etmektedir. alıřmaların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.



PROJE ADI : Kızılkaya-Bozova-Korkuteli-Elmalı-Finike Yolu

PROJE BEDELİ : 244.000.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 1974-2020

PROJE ÖZELLİKLERİ : Proje uzunluğu 159 km, Antalya ilindeki uzunluğu 150 km,dir. 2017 Yılında 5 km yol ve aşınma yapılması hedeflenmiştir. Kızılkaya Ayr.-Bozova-Korkuteli-Elmalı arası 2017 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Burdur Ayr.-Kızılkaya-Korkuteli BY/BSK ihalesi 05.05.2017 tarihinde yapılmış, ihale süreci devam etmektedir.



PROJE ADI : Kızılkaya Ayr.-Antalya (Antalya-Afyonkarahisar Yolu)

PROJE BEDELİ : 359.000.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2004-2020

PROJE ÖZELLİKLERİ : Mevcut yol uzunluğu 217 km, proje uzunluğu 214 km'dir. Antalya ilindeki mevcut yol uzunluğu 46 km, proje uzunluğu 43 km (46 km' si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır) 2017 Yılında Kızılkaya Ayr.-Antalya arasında Çubukbeli Tünelinde çalışılması hedeflenmiştir. Kızılkaya Ayrımı-Antalya arasına toplam uzunlukları 3.960 m olan çift tüp Çubukbeli Tüneli yapılacaktır. Yol ve köprülÜ kavşak çalışmalarının Çubukbeli Tüneli ile birlikte ihalesi yapılmış, 24.01.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 3 km kısalma olacaktır.



PROJE BEDELİ : 977.000.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2016-2020

PROJE ÖZELLİKLERİ : Mevcut yol uzunluğu 82 km, proje uzunluğu 70 km'dir. 6 km'si BY/BSK ve 53 km'si TY/BSK olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında 3 km BY/BSK, 10 km TY/SKÜBSK (tekyol üzeri sathi kaplama üstü BSK) yapılması hedeflenmektedir. Güzergahta 10,7 km uzunluğunda 4 adet çift tüp tünel (toplam uzunluk: 21,45 km), 2 km uzunluğunda 4 adet köprü ile birlikte proje çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmaları tamamlanmış olan Geriş Ayr.-Akseki arasının (10 km) kesimin ihalesi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Devamında 17 km'lik kesimin BY/BSK ihalesi 06.07.2017 tarihinde yapılmış, ihale süreci devam etmektedir. Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 12 km kısalma olacaktır






PROJE ADI : Antalya-Dereboğazi-Isparta Yolu

PROJE BEDELİ : 321.776.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2015-2020

PROJE ÖZELLİKLERİ : Toplam uzunluğu 114 km, proje uzunluğu 104 km'dir. Antalya ilindeki mevcut yol uzunluğu 37 km, proje uzunluğu 35 km'dir. 9 Km'si BY-BSK, 1 km'si TY/BSK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 6 km BY/BSK yapılması ve 55 metre uzunluğunda 1 adet çift köprü yapılması hedeflenmektedir. 23 m uzunluğundaki Berber Köprüsü tamamlanmıştır. BY/BSK çalışmaları devam etmektedir. Manavgat Ayrımından Km:11+500-26+000 arasında BY/BSK yapım çalışmaları , Km: 26+000-37+000 arasında BY/BSK proje çalışmaları devam etmektedir. Yapım çalışmaları tamamlandığında güzergahta 10 km, Antalya ilinde 2 km kısalma olacaktır.



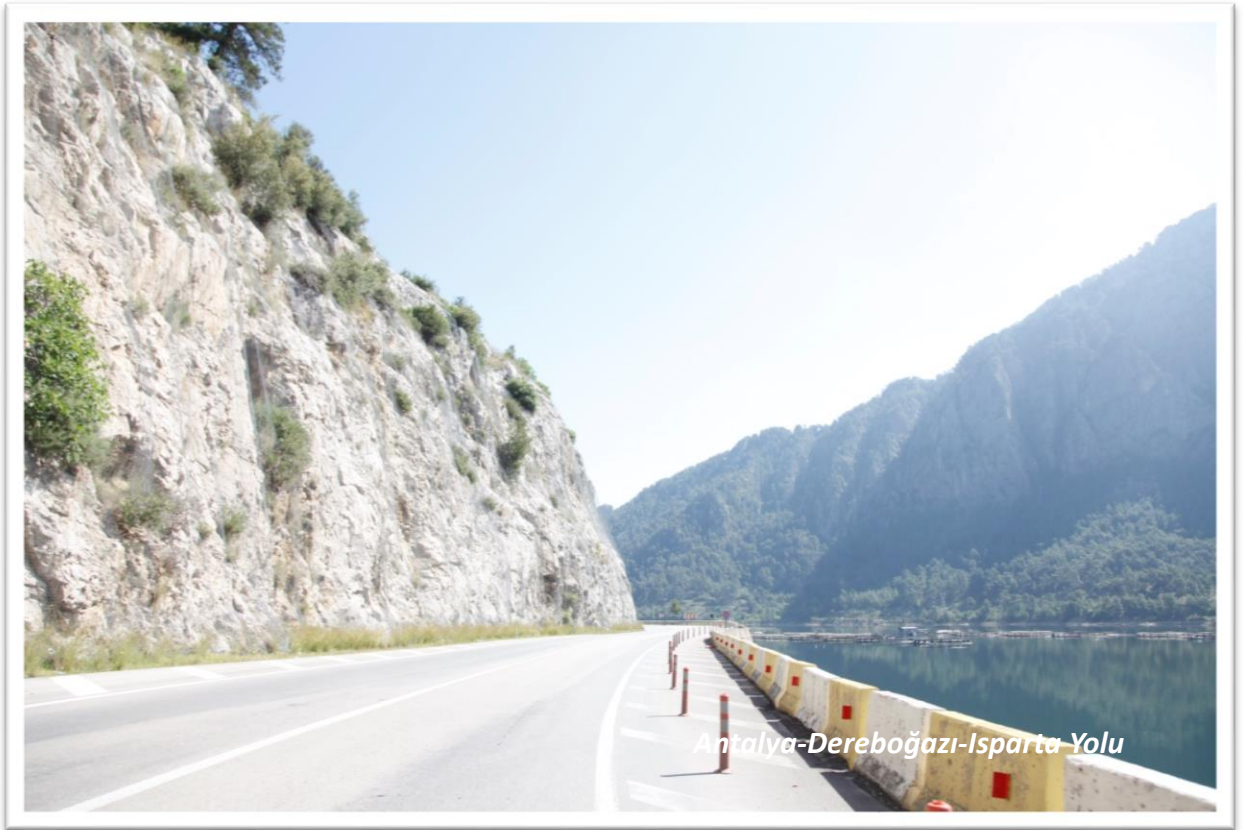

PROJE ADI : Antalya Kuzey Çevre Yolu

PROJE BEDELİ : 418.260.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2014-2020

PROJE ÖZELLİKLERİ : Toplam uzunluğu 51 km'dir. 37 km' lik Organize Sanayi-Serik arasında BSK bölünmüş yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Termessos-Organize Sanayi Kavşağı arasınının (13 km) proje çalışmaları tamamlanma aşamasındadır.

2017 yılında 7 km BY/BSK yapılması hedeflenmektedir. Toprak işleri ve sanat yapıları ve köprülülük kavşak yapım çalışmaları devam etmektedir. Yapım çalışmalarının Isparta-Dereboğazı yolu ayırımına kadar 2018, kalan kesimlerin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.





PROJE ADI : (Antalya-Manavgat)Ayr.-Taşagil –İbradı Ayr.3.BI.Hd.Yolu

PROJE BEDELİ : 803.078.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2004-2017

PROJE ÖZELLİKLERİ : Toplam 67 km uzunluğundaki yolda 4 km'si BY/SK, 29 km'si TY/SK olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında 4 km BY/BSK, 2 km TY/SK ve 4 km BY/SKÜBKS yapılması , Demirkapı Tüneli 1.Tüpünün tamamlanması hedeflenmektedir. Yıl içinde 2,7 km TY/SK tamamlanmıştır. 16 Km' lik kesimin BY/BSK yol ile birlikte Demirkapı 2.Tüp Tünelinin ihale hazırlıkları devam etmektedir. Km:0+000-16+000 arasının BSK ihalesi 27.04.2017 tarihinde yapılarak, 29.05.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.

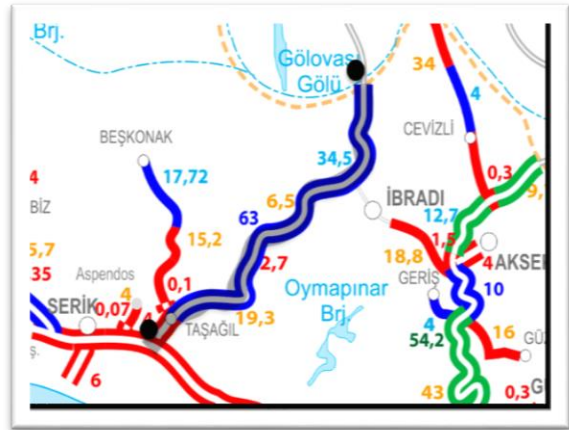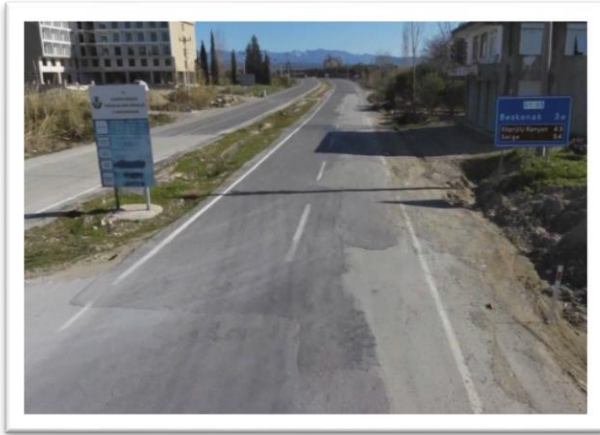

KURUMU : KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI : Kalkan-Kaş-Finike

PROJE BEDELİ : 976.003.000


TOPLAM HARCAMA : 6.000.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 1979-2020

PROJE ÖZELLİKLERİ : Mevcut yol uzunluğu 98 km, proje uzunluğu 73 km'dir. 9 km'si BY/BSK, 3 km'si BY/SK olmak üzere 11 km'si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında Kalkan-Finike arasında 70 km TY/SKÜBSK yapılması ve binder seviyesinde tamamlanmış olan 21 km'de aşınma yapılması hedeflenmektedir. Yıl içinde 12 km TY/SKÜBSK tamamlanmıştır. (Kaş-Kasaba)Ayr. Demre arasında 37 km ile Kalkan-(Kaş-Kasab)Ayr.-arasında 35 km'lik kesimin BSK üst yapı ihalesi 11.01.2017 tarihinde yapılmıştır. Kalkan – Finike arası 73 km BY projesi devam etmekte olup, projede 7 adet (17.460m) tünel, 9 adet (1478m) köprü, 4 adet (362m) viyadük bulunmaktadır. Proje tamamlandığında güzergahta 33 km kısalma olacaktır



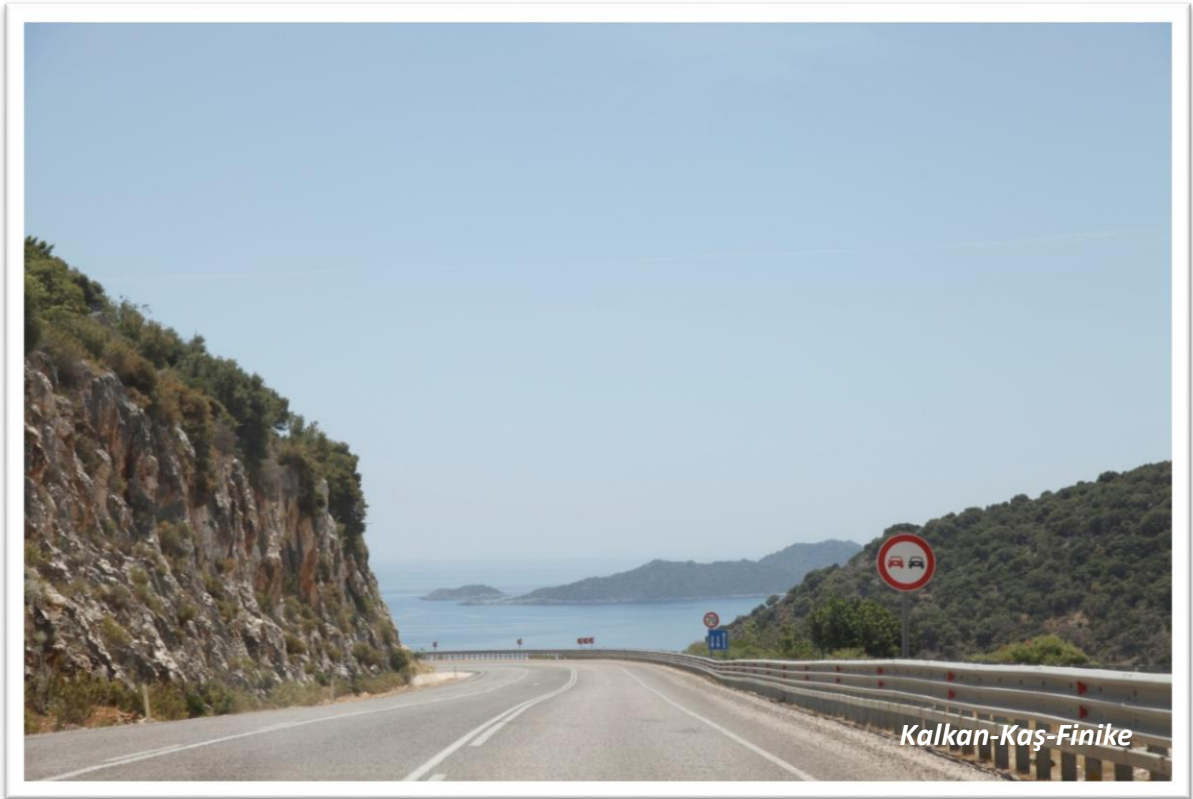

PROJE ADI : (Korkuteli-Elmalı)Ayr.-Kızılcadağ

PROJE BEDELİ : 12.629.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2012-2018

PROJE ÖZELLİKLERİ : Toplam uzunluğu 18 km dir. 12 km'si TY/SK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 5 km TY/SK yapılması hedeflenmektedir. Çalışmaların 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Proje'nin Resimleri



PROJE ADI : Taşagıl Ayr.-Beşkonak

PROJE BEDELİ : 59.814.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2011-2018

PROJE ÖZELLİKLERİ : Toplam uzunluğu 33 km'dir. 15 km' si TY/SK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 2 km TY/SK yapılması hedeflenmektedir. Yapım çalışmalarının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.



PROJE ADI : (Akseki-Manavgat)Ayr.-Gündoğmuş-Köprülü

PROJE BEDELİ : 39.882.000

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2005-2018

PROJE ÖZELLİKLERİ : Toplam 66 km uzunluğundaki yolun 30 km'si TY/SK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 5 km TY/SK yapılması hedeflenmektedir.



KURUMU : KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ADI : Antalya-Korkuteli-Söğüt-Çavdır-2. Bl.Hd. (Antalya-Denizli)
PROJE BEDELİ : 194.580.000
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2006-2020
PROJE ÖZELLİKLERİ : Toplam uzunluğu 132 km'dir. 33 km'si BY-BSK ,99 km'si BY-SK olarak tamamlanmıştır . Antalya ilindeki uzunluğu 85 km'dir. 33 Km'si BY-BSK, 52 km'si BY-SK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 5 km BY/SKÜBSK yapılması hedeflenmektedir. Sathi Kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmış kesimlerin BSK üstyapı halesi 18.10.2016 tarihinde Genel Müdürlükçe yapılarak, 09.02.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Çalışmaların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.





Antalya-Korkuteli-Söğüt-Çavdır-2. Bl.Hd.



Antalya-Korkuteli-Söğüt-Çavdır-2. Bl.Hd.
